

人工林整備事業（防災減災対策施工地）

1 概要

工事名 令和2年度 あいち森と緑づくり森林整備事業 新城人3号工事

施工場所 新城市長篠ほか 地内

施工面積 32.82ha

(間伐本数 13,770本 420本/ha 間伐率40%)

施工期間 令和2年6月23日から令和3年3月3日

最終契約金額 56,471,800円 (1,720千円/ha)

上記の内数

防災減災区分（ライフラインの確保に伴う伐採）

面積 5.11ha 延長 約500m

対象金額 22,189,000円 (4,342千円/ha)

搬出量及び搬出先 針葉樹 294.25 m³ (HOLZ 三河)


広葉樹 35.20 m³ (鳳来精密株式会社)

合計 329.45 m³

2 位置図



補助位置図

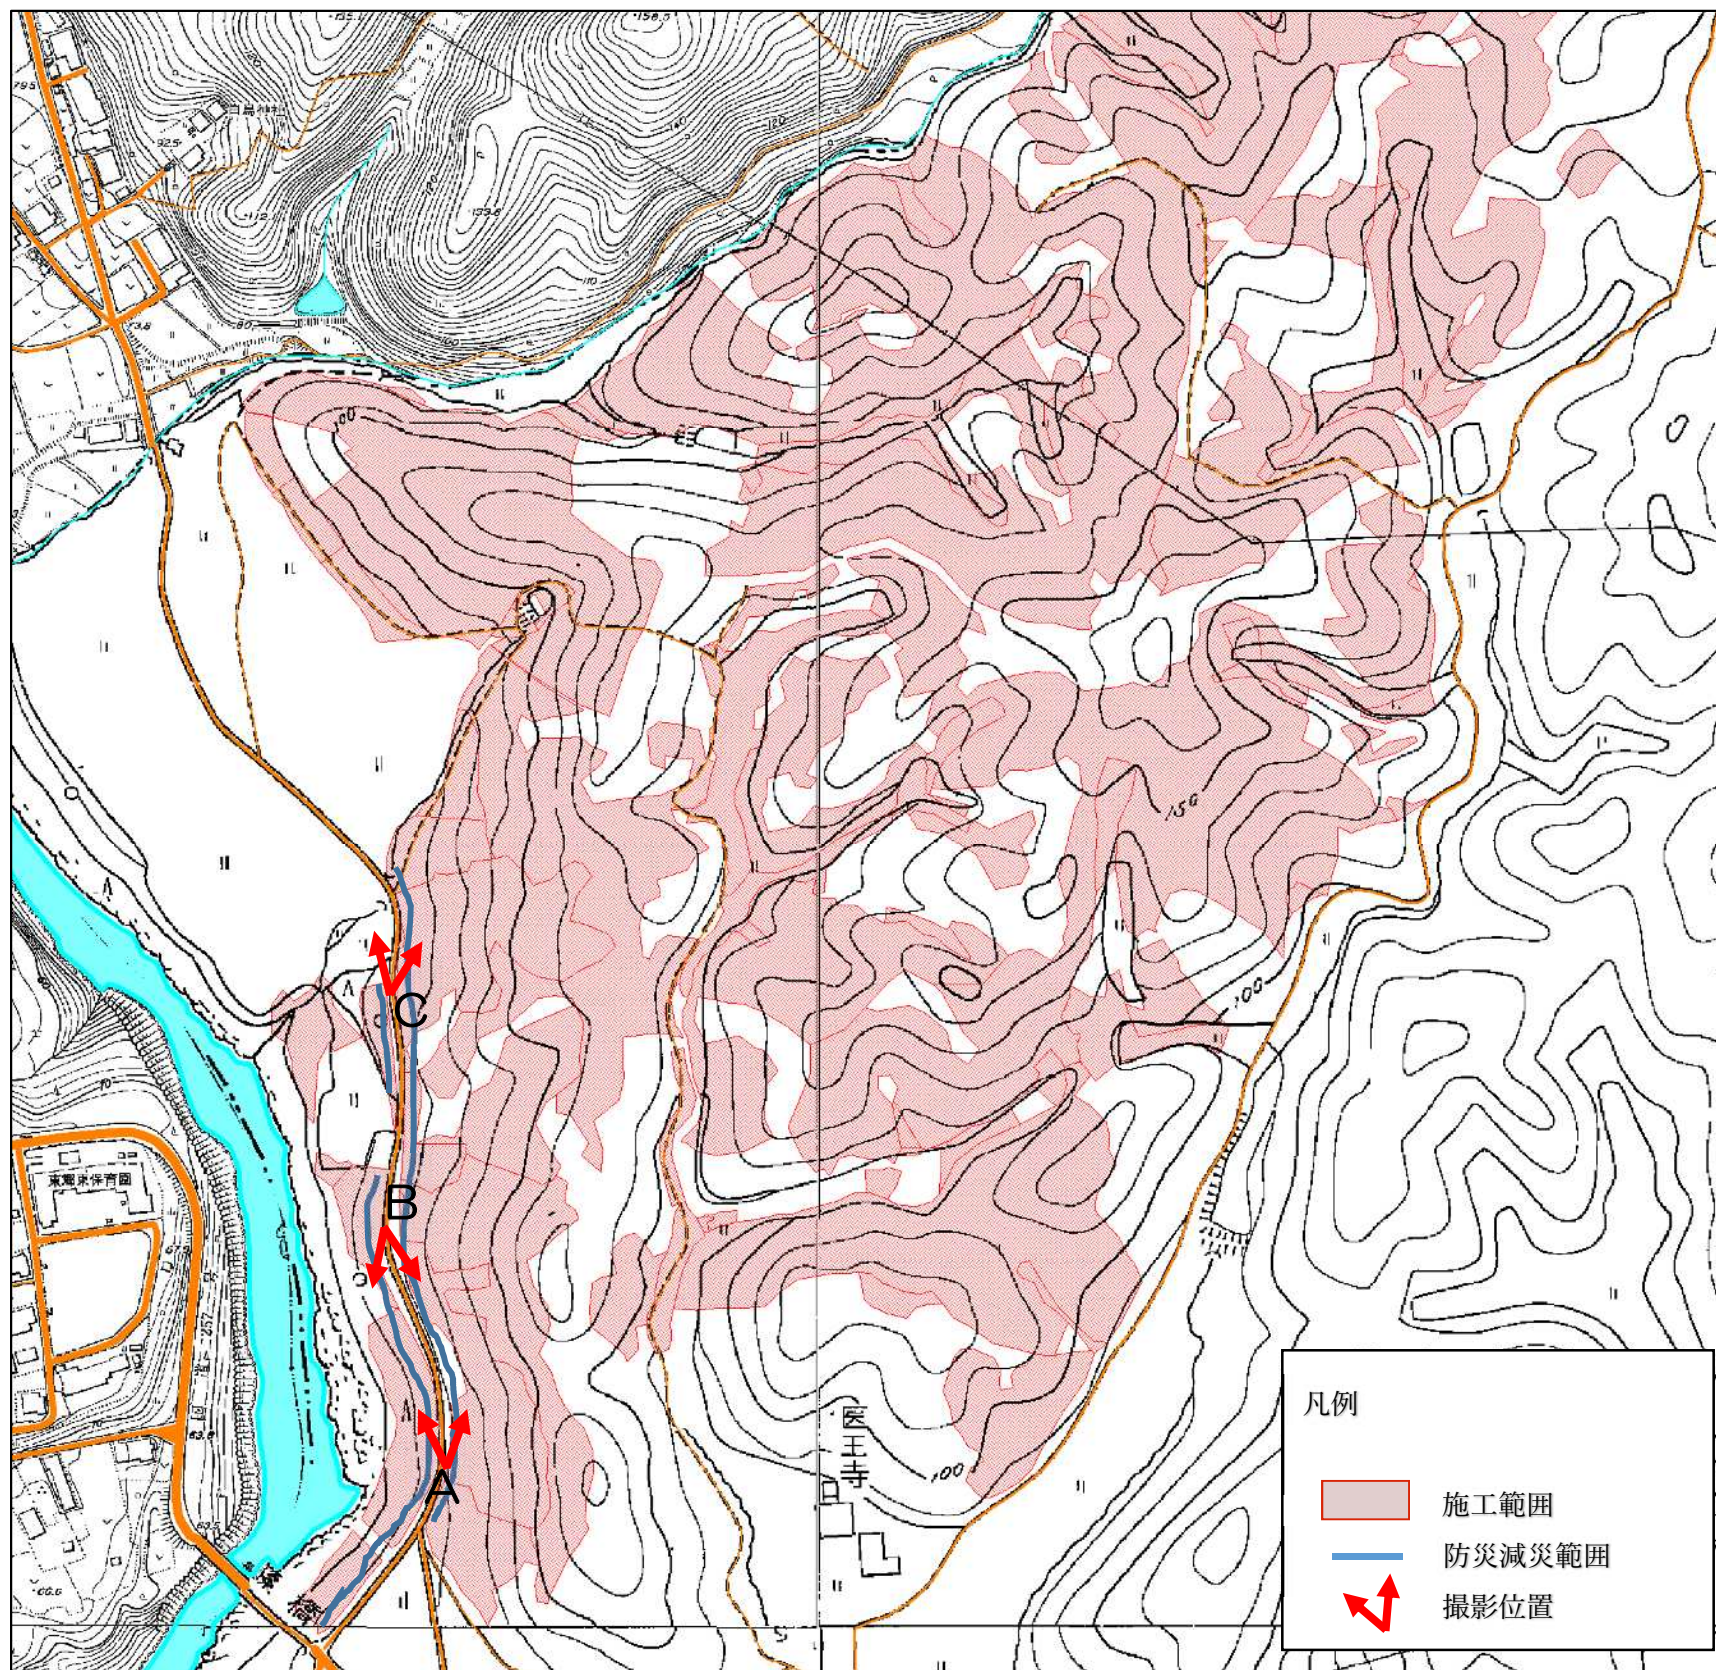

人工林整備事業（防災減災対策施工地）

3 工事写真

施工前



作業中（イメージ）




施工後



人工林整備事業の様々な作業種

防災減災対策：機械を用いての伐採作業

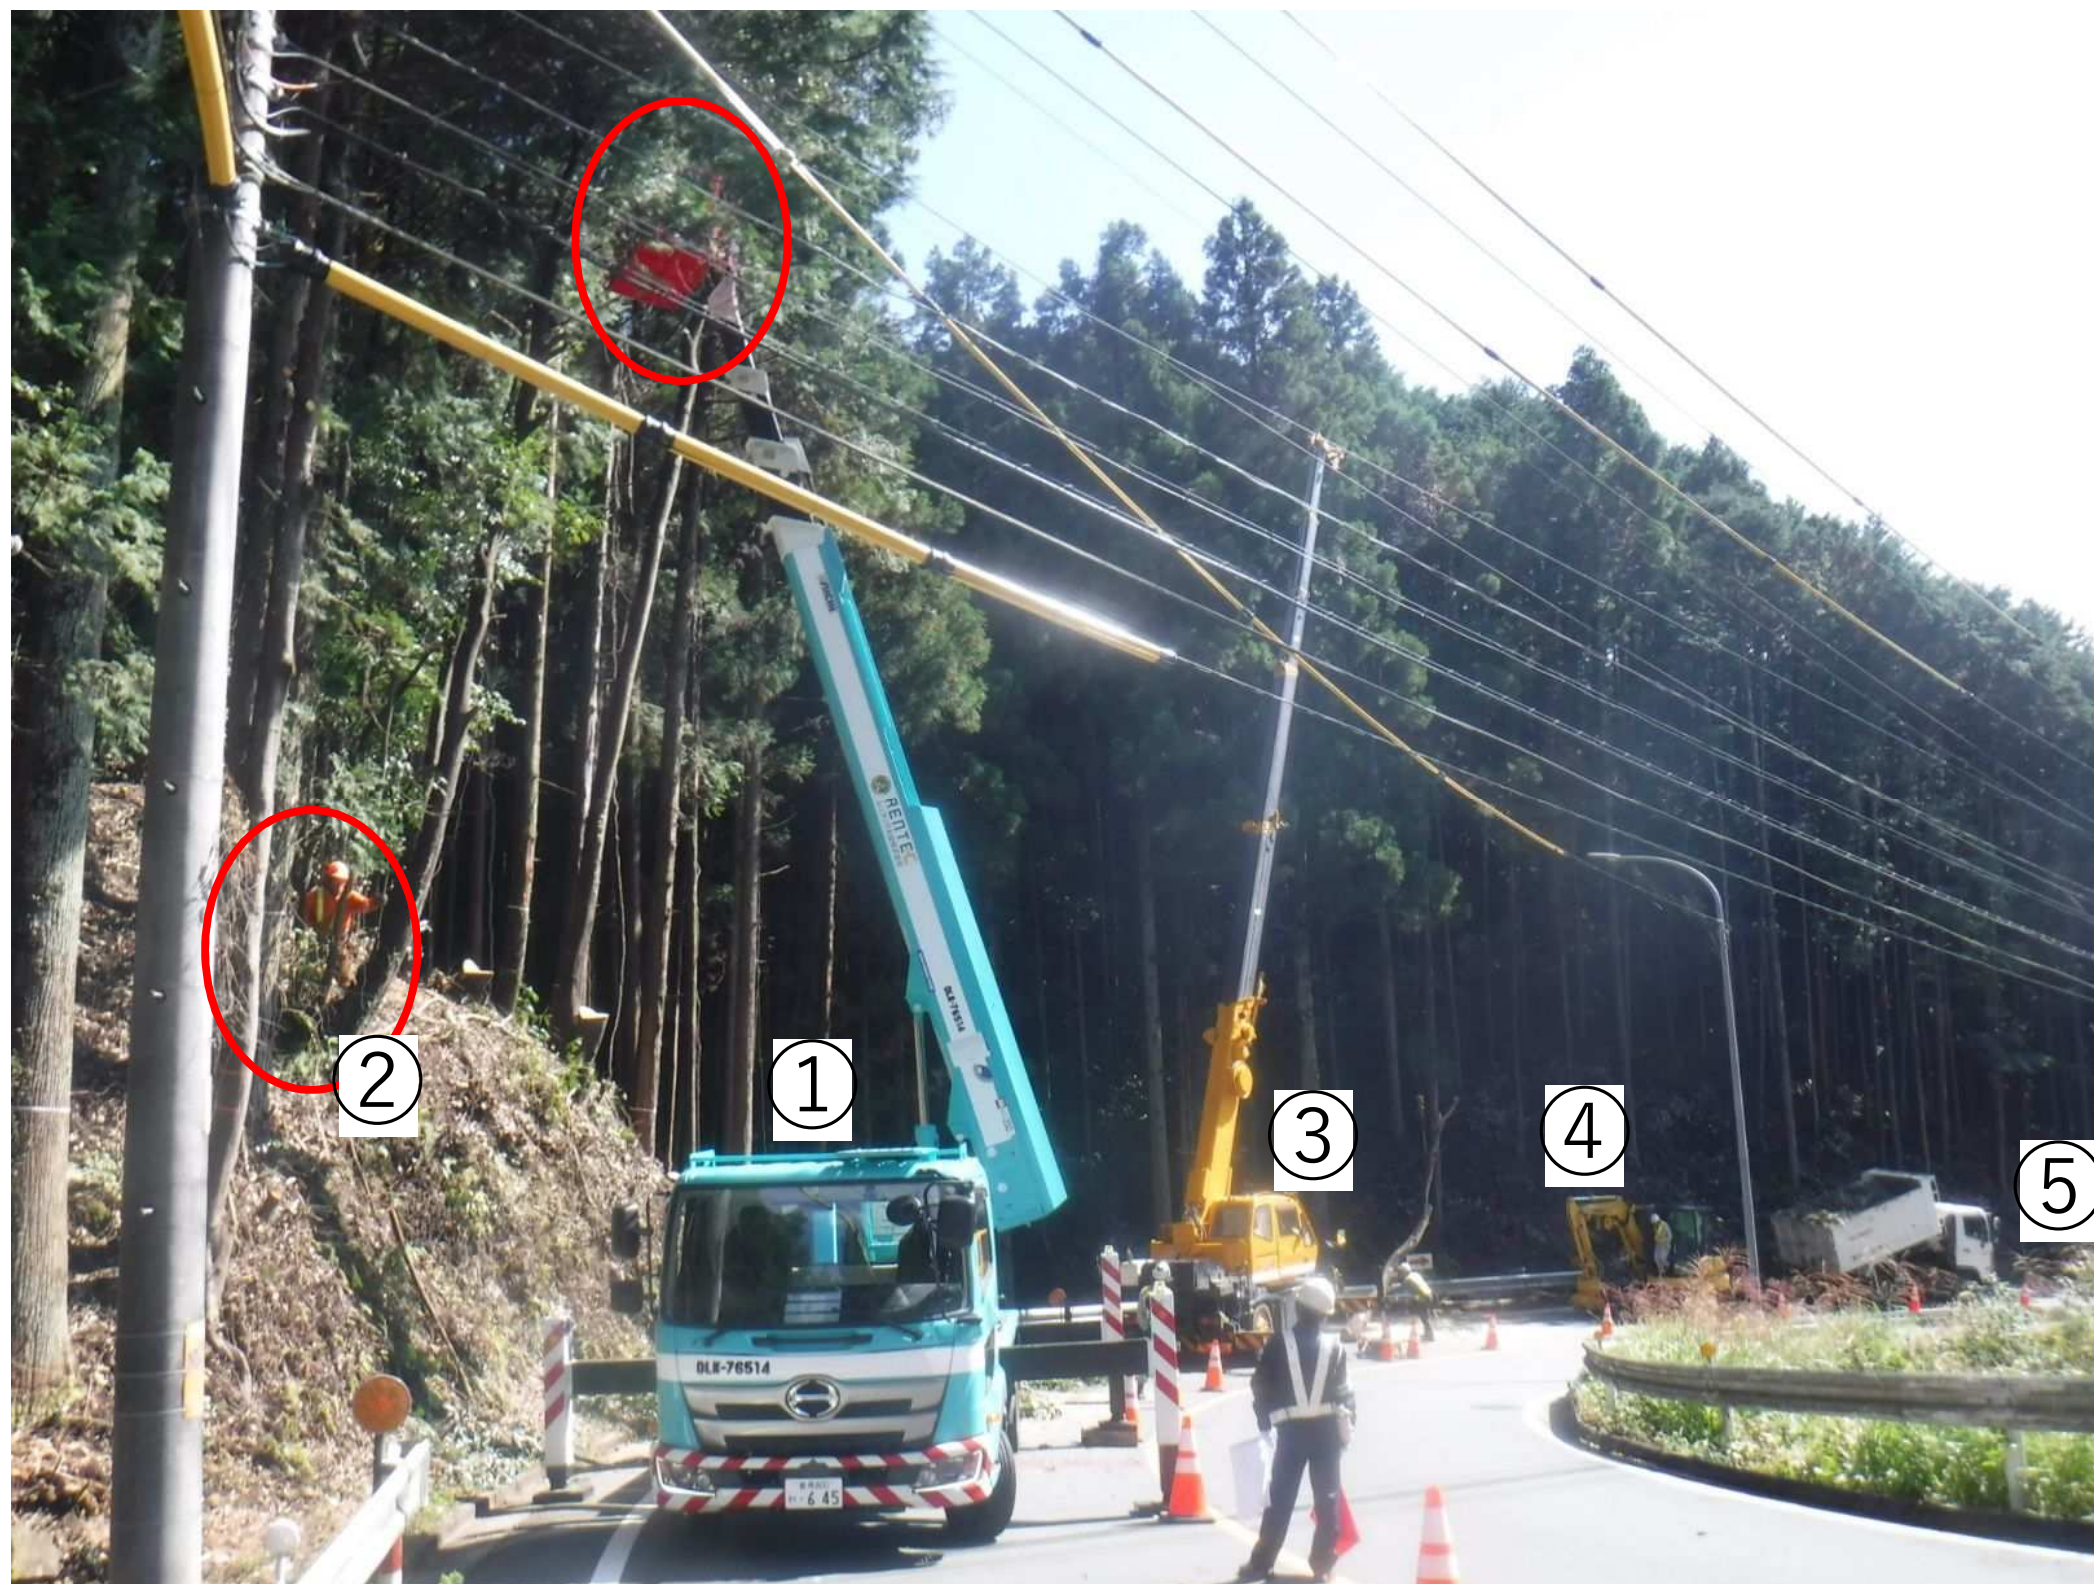

作業システム

- ① 人力・高所作業車
枝払・上部伐採
- ② 人力
根伐り（伐採）
- ③ 人力・クレーン
樹木吊り下げ
移動
- ④ 人力・グラップル
玉切り・積み込み
- ⑤ トラック
木材運搬

※○作業方法 上段
作業内容 下段

人工林整備事業の様々な作業種



高所特殊作業による枝落とし

牽引具使用伐採 (伐倒とチルホールによる牽引)

