

災害時対応 高潮編

災害時対応 高潮編 目次

1. 高潮発生時の対応（行動）	1
（1） 高潮発生時の対応計画	1
（2） 高潮発生時の対応（行動）のタイムライン【高潮】	2
（3） 直前予防措置の役割分担【高潮】	3
（4） 発災後の対応（行動）の役割分担【高潮】	4
2. 高潮発生時の時間別行動	5
（1） 直前予防措置	5
（2） 3時間以内の行動	7
（3） 1日以内の行動	7
（4） 3日以内の行動（方針決定）	8
（5） 1週間以内の行動（応急措置）	11
（6） 2週間以内の行動（応急復旧着手）	14
（7） 暫定物流の再開まで順次	16
（8） 衣浦港フェーズ別高潮・暴風対応計画	18

1. 高潮発生時の対応(行動)

(1) 高潮発生時の対応計画

現況体制におけるボトルネック解決策を、発災後の時系列で整理する。


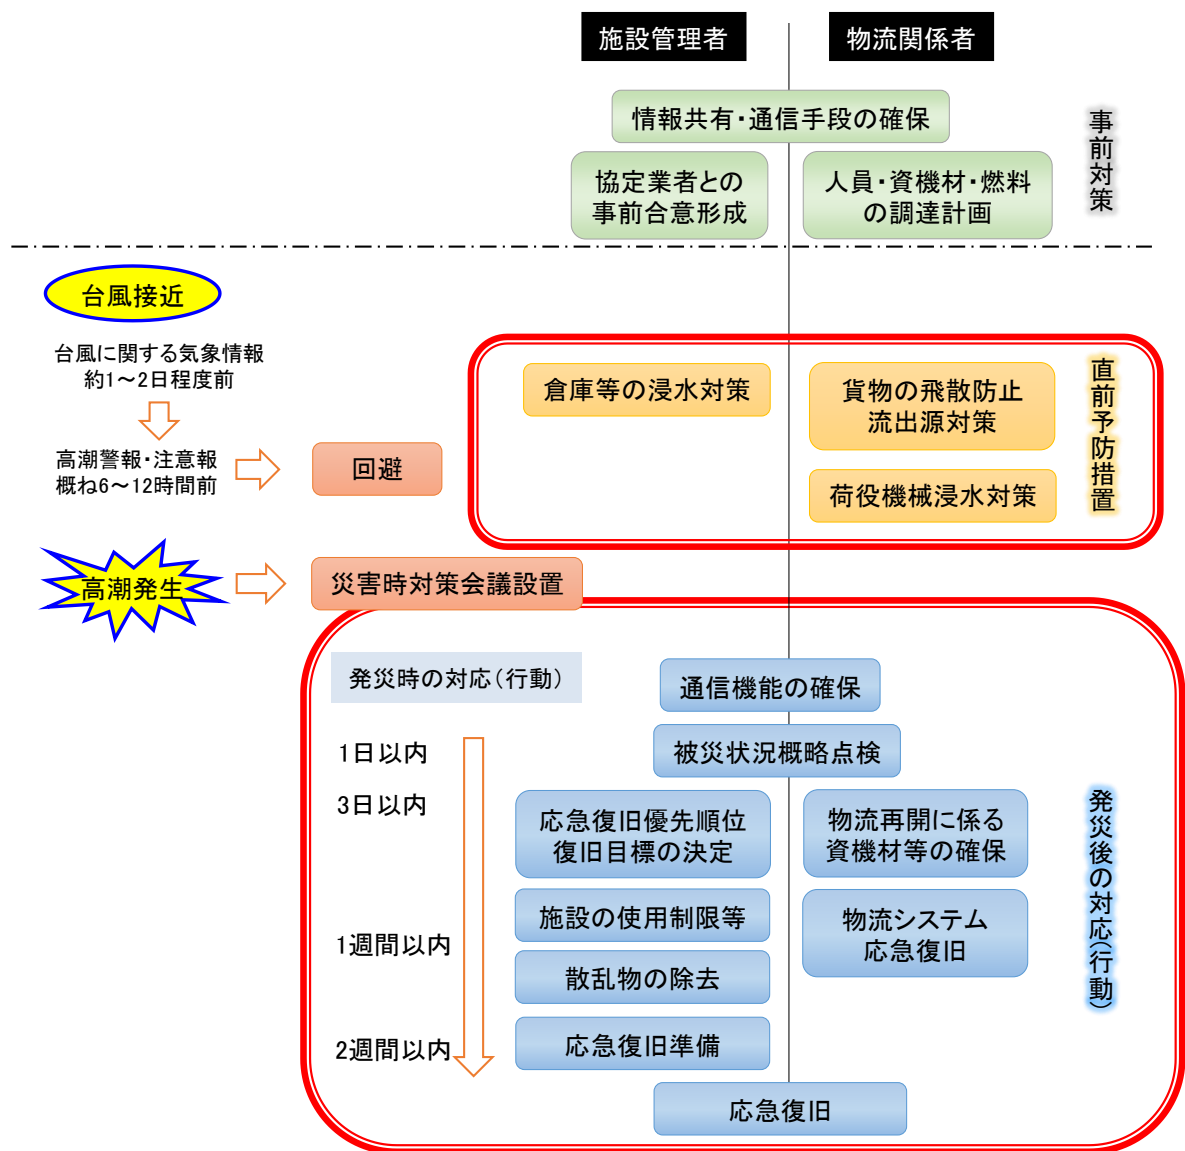


図-1 直前予防措置および発災後の対応(行動)の位置付け【高潮】

1. 高潮発生時の対応（行動）
(2) 高潮発生時の対応（行動）のタイムライン【高潮】

(2) 高潮発生時の対応（行動）のタイムライン【高潮】

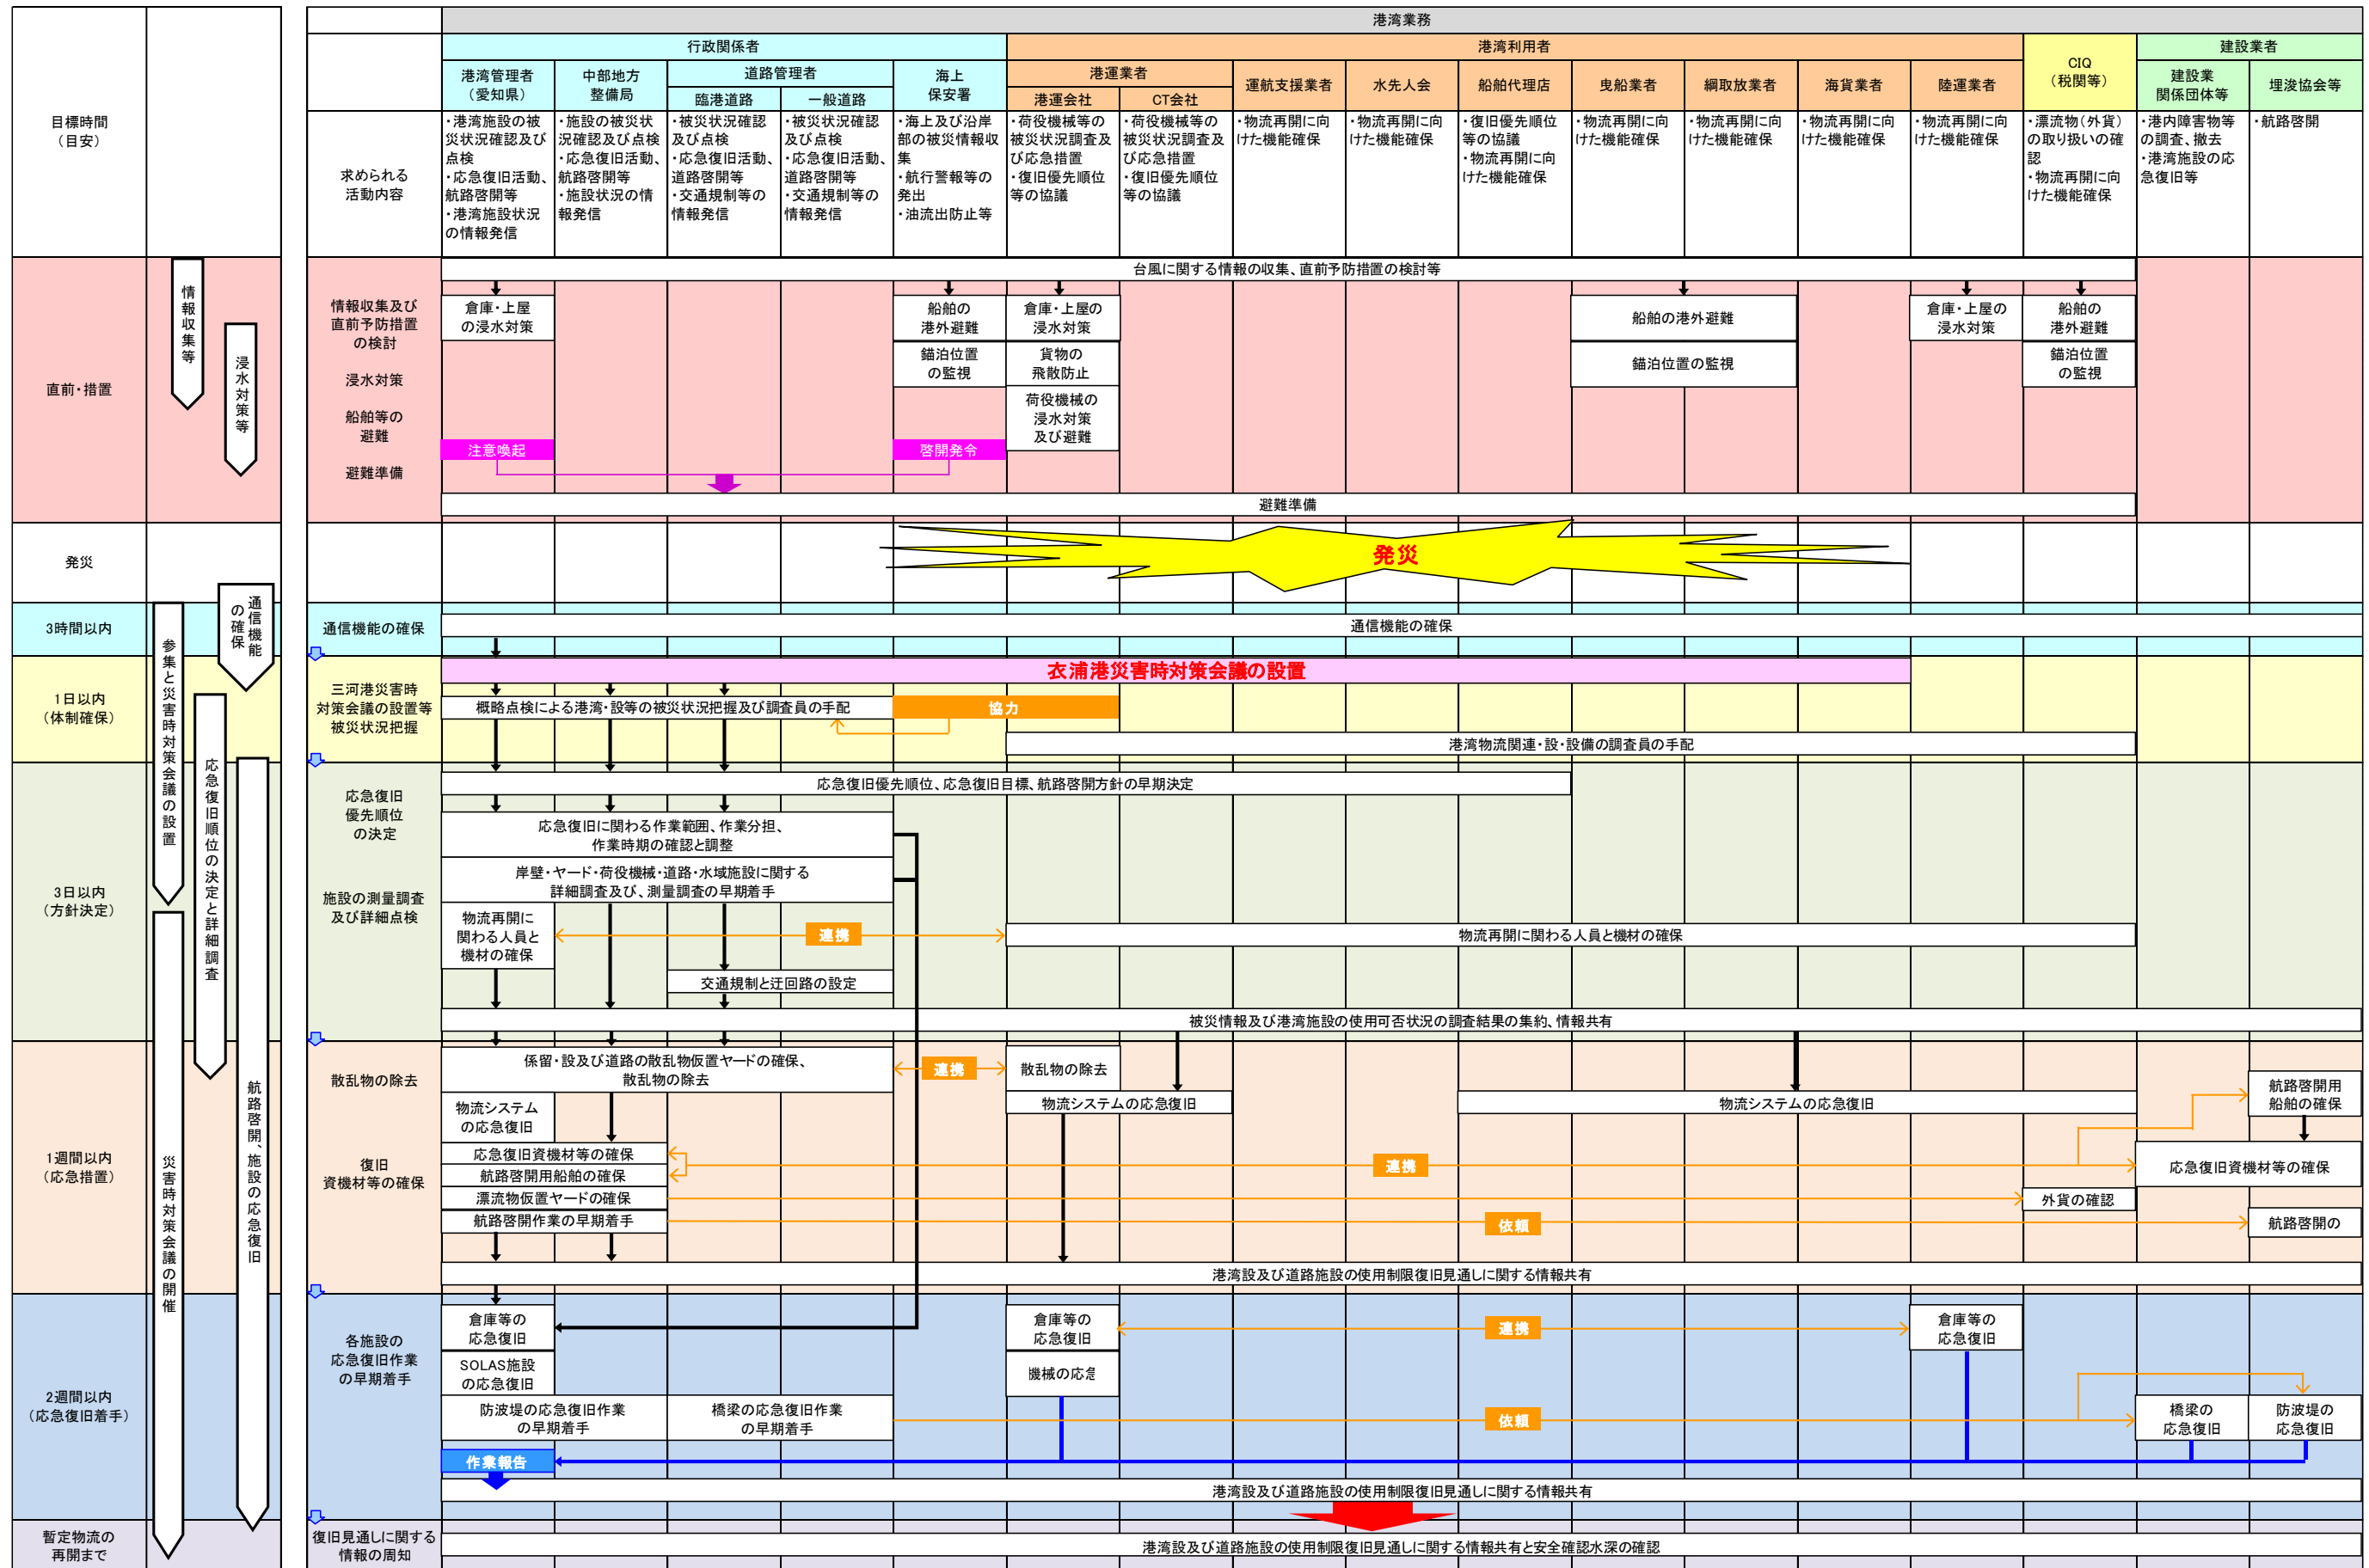

(3) 直前予防措置の役割分担【高潮】

施設	項目	項目 番号	行動	行政関係者					港湾利用者								CIQ (税関等)	建設業者		項目 番号
				港湾 管理者 (愛知県)	中部地方 整備局	道路管理者		海上 保安部	港運業者 CT業者	運航支援 業者	水先 人会	船舶 代理店	曳船業者	綱取放 業者	海貨業者	陸運業者		建設業 関係団体等	埋浚協会等	
						臨港道路	一般道路													
係留施設、 荷捌き施設 及び保管施設等	貨物の飛散防止、流出源対策	1	・L型擁壁の設置・漂流防止ネットの設置						◎										1	
	倉庫・上屋の浸水対策	2	・閉鎖または施錠状況の確認及び土嚢等による浸水防止	◎					◎						◎				2	
	荷役機械の浸水対策	3	・荷役機械の避難						◎										3	
船舶	船舶の避難	4	・港外避難					◎		◎			◎	◎			◎		4	
		5	・錨泊位置の監視					◎		◎			◎	◎			◎		5	

※ ◎: 主体応、○: 協力

（４）発災後の対応（行動）の役割分担【高潮】

目標時間 (目安)	施設	項目	項目 番号	対応計画	行政関係者				港湾利用者							CIQ (税関等)	建設業者		項目 番号			
					港湾 管理者 (愛知県)	中部地方 整備局	道路管理者		海上 保安署	港運 業者	運航支援 業者	水先 人会	船舶 代理店	曳船 業者	綱取放 業者		海貨 業者	陸運 業者		建設業 関係団体等	埋没 協会等	
3時間以内	共通	通信機能の確保	1	・通信機能の確認	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	1		
1日以内	共通	衣浦港災害時対策会議	2	・衣浦港災害時対策会議の設置	◎	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2		
		被災状況概略点検による被災状況の把握	3	・港湾施設及び道路施設の概略被災状況点検	◎	◎	◎	○	◎											3		
			4	・港湾物流関連施設・設備(橋梁、荷役機械、物流システム等)の点検調査員の手配	◎	◎	◎	○		◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎			4		
		施設の応急復旧優先順位及び 応急復旧目標の設定	5	・応急復旧優先順位、応急復旧目標の早期決定	◎	◎	◎	○	○	○			○							5		
3日以内 (方針決定)	共通	・発災時航路啓開方針の早期決定	6		◎	◎			○										○	6		
		作業範囲、作業分担の調整	7	・施設の応急復旧に関わる作業範囲、作業分担及び作業時期の確認と調整	◎	◎	◎	◎												7		
		被災状況詳細調査の早期着手	8	・岸壁、ヤード、道路等に関する被災状況詳細調査の早期着手と情報の利用者への周知	◎	◎	◎	○												8		
			9	・水域施設に関する被災詳細調査の早期着手と情報の利用者への周知	◎	◎			○										○	9		
		応急復旧用作業船及び係留場所の不足対応	10	・発災時の応急復旧用作業船係留場所の早期確認	◎	○													◎	10		
			11	・応急復旧用作業船の手配(広域連携含む)	◎	◎	◎												◎	11		
		応急復旧作業用重機、応急復旧用作業船燃料の確保	12	・応急復旧作業用重機、応急復旧用作業船燃料の調達、確保	○	○	○	○										◎	◎	12		
		物流の再開に関わる人員及び機材の確保	13	・物流の再開に関わる関係者の参集	◎	○	○		○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			13	
			14	・物流の再開に関わる船舶・機材の確保						◎		◎		◎		◎	◎	◎			14	
		事務所建屋の浸水の応急措置	15	・業務再開に向けた応急措置	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎			15	
		係留施設等(バルク貨物)	岸壁の応急措置	16	・使用制限に関する情報の周知	◎	◎			○											16	
		道路	道路の応急措置	17	・交通規制等と耐震強化岸壁に通ずる道路の啓開及びその情報の周知	○		◎	○												17	
	18			・長期浸水対策用排水ポンプの調達	○	○	◎	○											○		18	
	対象道路上の橋梁	橋梁の応急措置	19	・交通規制と迂回路の設定及び、その情報の周知	○		◎	○												19		
	沈埋トンネル	沈埋トンネルの浸水の対応	20	・交通規制および、その情報の周知	○			○												20		
	臨海鉄道	立体交差部の落橋による道路の遮断の対応	21	・交通規制と迂回路の設定及び、その情報の周知	○				◎(臨鉄)											21		
1週間 以内 (応急 措置)	共通	散乱物の除去(係留施設)	22	・散乱物(貨物、瓦礫)仮置ヤードの確保	◎					◎										22		
			23	・散乱物除去用機材の確保(建設業関係団体等)	○					◎								◎		23		
			24	・散乱物の除去	◎					◎								◎		24		
		散乱物の除去(道路)	25	・散乱物(貨物、瓦礫)仮置ヤードの確保	◎		◎			○											25	
			26	・散乱物除去用機材の確保(建設業関係団体等)	○		◎	○		○									◎		26	
			27	・散乱物の除去	○		◎	○		○									◎		27	
		物流システムの応急復旧(データ損失等を含む)	28	・システム復旧作業の早期着手	◎					◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎				28	
	応急措置に関する情報提供	29	・港湾施設及び道路施設の使用制限に関する情報の周知	◎	◎	◎	○	○												29		
	水域施設 (航路、泊地)	航路啓開	30	・漂流物(貨物、瓦礫)仮置ヤードの確保	◎	○			○								○				30	
			31	・航路啓開用船舶、機材の確保(埋没協会等)	○	○			○											◎	31	
			32	・啓開作業の早期着手	◎	○			○											○	32	
			33	・潜水土の確保、他県への要請																◎		33
沈埋トンネル	沈埋トンネルの浸水の対応	34	・他機関からの排水ポンプの確保		○		○											○		34		
2週間 以内 (応急復 旧着手)	共通	応急復旧状況に関する情報提供	35	・港湾施設及び道路施設の使用制限及び、復旧見通しに関する情報の周知	◎	◎	◎	○	○											35		
	係留施設等 (バルク貨物)	荷役機械の応急復旧(グラブバケット、ホッパー等)	36	・発災時応急復旧作業の早期着手						◎									○		36	
		倉庫・上屋の浸水の応急復旧	37	・発災時応急復旧作業の早期着手	◎					◎						◎	○				37	
	SOLAS施設の応急復旧	38	・発災時応急復旧作業の早期着手	◎														○		38		
	外郭施設(防波堤)	防波堤の応急復旧	39	・発災時応急復旧作業の早期着手	◎	◎														○	39	
	対象道路上の橋梁	橋梁の応急復旧	40	・発災時応急復旧作業の早期着手	○		◎	○											○		40	
沈埋トンネル	沈埋トンネルの浸水の対応	41	・発災時応急復旧作業の早期着手	○			○											○		41		
暫定物流の 再開まで順次	係留施設等 (バルク貨物)	港内静穏度の不足対応	42	・係留を補助するタグボートの手配	○								◎	◎							42	
		SOLAS施設の応急復旧	43	・SOLAS要員の確保	◎																	43
		応急復旧状況に関する情報提供	44	・使用制限及び、復旧見通しに関する情報の周知	◎	◎																44
	水域施設(航路、泊地)	航路啓開後の水深の確認	45	・安全確認水深の確認と情報の周知	◎	◎			◎		○											45
	道路	貨物輸送ルートの確認	46	・通行可能ルートの情報の周知	○		◎	○		○							○					46
	対象道路上の橋梁	貨物輸送ルートの確認	47	・通行可能ルートの情報の周知	○		◎	○		○							○					47
	沈埋トンネル	貨物輸送ルートの確認	48	・通行可能ルートの情報の周知	○		◎	○		○							○					48

※ ◎:主体応、○:協力 係留施設等:係留施設、荷捌き施設及び保管施設等 一般道路:衣浦トンネルおよび岸壁からくしの齒ルートに接続する一般道路を対象。各施設管理者が港湾BCPに協力いただくものとする。

2. 高潮発生時の時間別行動

(1) 直前予防措置

台風の接近は、地震・津波の被災時と異なり、2～3 日前から予測が可能のため、下図に示す「直前予防措置」を行うことが可能である。

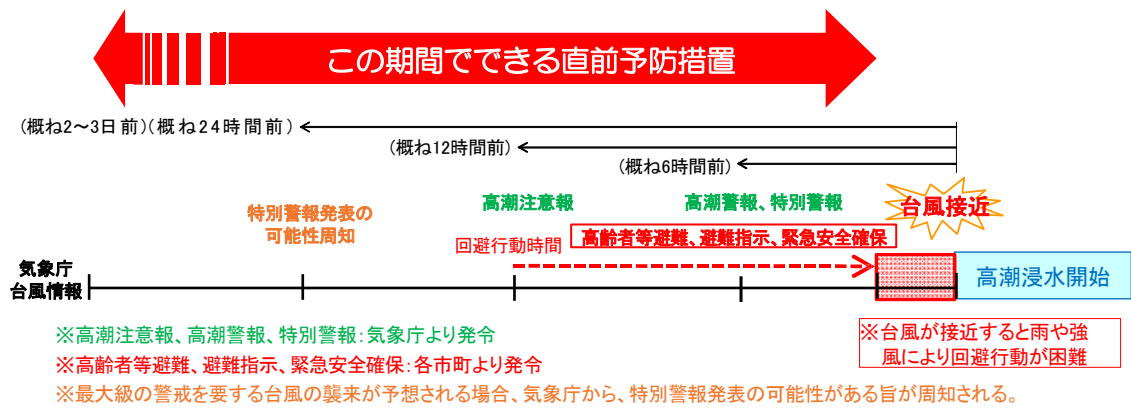


図-2 直前予防措置のイメージ

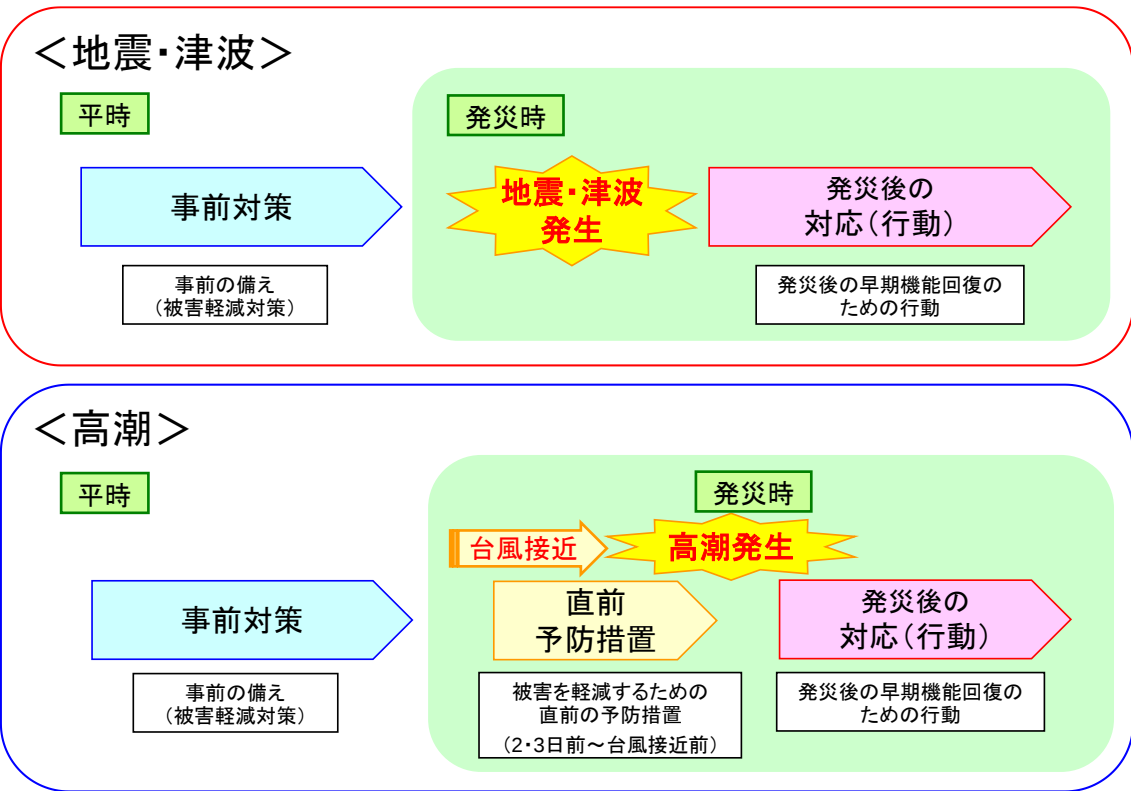


図- 3 地震・津波対策と高潮対策の違い

2. 高潮発生時の時間別行動

(1) 直前予防措置

※丸囲み番号項目（太タイトル）の末尾に記載した〔番号〕は、
役割分担一覧表の項目番号（赤文字）とリンクしている。

1) 保管施設 - 貨物の飛散防止、流出源対策

①L 型擁壁の設置・漂流防止ネットの設置 [1]

港運業者は、L 型擁壁による出入り口の封鎖や漂流防止ネット等の設置を行う。

2) 保管施設 - 倉庫・上屋の浸水対策

①閉鎖または施錠状況の確認及び土嚢等による浸水防止 [2]

港湾管理者、港運業者および陸運業者は、浸水を防止するため上屋・倉庫の閉鎖および施錠の確認を行う。また、土嚢等により建物への浸水を防ぐ。

3) 荷役機械 - 荷役機械の浸水対策

①荷役機械の避難 [3]

港運業者は、荷役機械の浸水被害を防止するため、堤内地等への退避、自走避難を行う。

4) 船舶 - 船舶の避難

①港外避難 [4]

衣浦海上保安署、曳舟業者、綱取放業者および CIQ は、運航支援業者に他船舶との位置関係などの情報を確認しつつ、船舶を安全な場所に避難する。

②錨泊位置の監視 [5]

衣浦海上保安署、曳舟業者、綱取放業者および CIQ は、レーダー等により自船の錨泊位置を確認しておく。また、運航支援業者は、退避船舶の位置関係について情報を収集し、無線等により船長にその情報を提供する等の協力を行う。

2. 高潮発生時の時間別行動

(2) 3 時間以内の行動

(3) 1 日以内の行動

(2) 3 時間以内の行動

1) 共通事項 - 通信機能の確保

①通信機能の確認 [1] ★

行政関係者、港湾利用者、建設業者および CIQ は、情報共有を行うための通信機能の確認を行う。通信が機能しない場合は、徒歩により直接連絡するなど、各関係機関への連絡手段を確保する。

⇒「発災時の緊急連絡体制」(6 資料編 資料 5)

⇒「緊急連絡先一覧」(6 資料編 資料 6)

⇒「関係機関の立地図」(6 資料編 資料 7)

(3) 1 日以内の行動

1) 共通事項 - 衣浦港災害時対策会議

①衣浦港災害時対策会議の設置 [2] ★

港湾管理者は、被災状況を鑑みて衣浦港災害時対策会議を設置する。

※衣浦港災害時対策会議：関係者全員が参集し、施設の被災状況、応急復旧状況、復旧順位や復旧見通しなどの情報交換を行うとともに、限られたバースの利用調整等について議論する会議

2) 共通事項 - 被災状況概略点検による被災状況の把握

①港湾施設及び道路施設の被災状況概略点検 [3] ★

港湾管理者、中部地方整備局、道路管理者および衣浦海上保安署は、速やかに目視等により港湾施設・設備の被災状況に関する概略点検を実施する。また、被災後の可能な範囲において関係機関が「三河港・衣浦港災害情報共有システム」を利用した被害状況調査を行い、情報を共有する。

なお、発災時概略点検マニュアルに基づく点検は、被害状況等必要に応じて港湾管理者から関係者へ依頼する。⇒「災害時概略点検マニュアル」(6 資料編 資料 13)

②港湾物流関連施設・設備(橋梁、荷役機械、物流システム等)の点検調査員の手配 [4] ★

港湾管理者、中部地方整備局、道路管理者、港運業者、船舶代理店、曳船業者、綱取放業者、海貨業者、陸運業者および CIQ は、特に専門的な知識を必要とする港湾物流に関わる施設・設備(橋梁、荷役機械、物流システム等)の被災状況調査や復旧に要する期間を早期に把握するため、点検・調査関係者を早期に手配する。⇒「被災状況点検・応急復旧工事に関する災害協定一覧表」(6 資料編 資料 12)

2. 高潮発生時の時間別行動
(4) 3日以内の行動（方針決定）

（４）３日以内の行動（方針決定）

1) 共通事項 - 施設の応急復旧優先順位及び応急復旧目標の設定

① 応急復旧優先順位、応急復旧目標の早期決定 [5] ★

港湾管理者、中部地方整備局および臨港道路管理者は、各施設の被災状況を整理し、港運業者と相談のうえ、応急復旧優先順位および概ねの応急復旧目標期間や回復率を設定する。

② 発災時航路啓開方針の早期決定 [6] ★

港湾管理者および中部地方整備局は、早期に被災状況を把握し、岸壁の応急復旧優先順位も踏まえて航路啓開の応急復旧優先順位を決定し、衣浦海上保安署及び埋浚協会等に連絡する。

⇒「被災状況点検・応急復旧工事に関する災害協定一覧表」（6 資料編 資料 9～11）

2) 共通事項 - 作業範囲・作業分担の調整

① 施設の応急復旧に関わる作業範囲、作業分担及び作業時期の確認と調整 [7] ★

港湾管理者、中部地方整備局および道路管理者は、応急復旧工事対象施設の作業分担を明確にする。

3) 共通事項 - 被災状況詳細調査の早期着手

① 岸壁、ヤード、荷役機械、道路に関する被災状況詳細調査の早期着手と情報の利用者への周知 [8] ★

港湾管理者、中部地方整備局および道路管理者は、施設の被災状況を踏まえ、測量会社等に各施設の被災状況詳細調査の早期着手を依頼する。また、港湾管理者は、各施設の被災状況を整理し、港湾利用者に周知させる。

② 水域施設に関する被災状況詳細調査の早期着手と情報の利用者への周知 [9] ★

港湾管理者および中部地方整備局は、測量会社等に水域施設の被災状況詳細調査の早期着手を依頼する。港湾管理者は、水域施設の被災状況を港湾利用者に周知させる。

4) 共通事項 - 応急復旧用作業船及び係留場所の不足対応

① 発災時の応急復旧用作業船係留場所の早期確認 [10] ★

港湾管理者は、係留施設の被災状況を踏まえて、埋浚協会等と調整し、作業船の係留場所を指定する。

②応急復旧作業船の手配(広域連携含む) [11] ★

埋浚協会等は、作業船の被災状況を確認し、啓開作業に投入可能な作業船の種類、規模、隻数を把握する。

5) 共通事項 - 応急復旧作業用重機、応急復旧用作業船燃料の確保

①応急復旧作業用重機、応急復旧用作業船燃料の調達、確保 [12] ★

建設業者は、石油関係業者等を通じて応急復旧に必要な重機および作業船の燃料の確保に努める。建設業者は、燃料の確保が困難な場合は、港湾管理者、中部地方整備局、道路管理者に燃料確保の協力を要請する。また、燃料等輸送に係る航路啓開および輸送船の入出港については衣浦海上保安署に確認を依頼する。

6) 共通事項 - 物流の再開に係わる人員及び機材の確保

①物流の再開に関わる関係者の参集 [13] ★

港湾管理者、港湾利用者およびCIQは、物流の再開に携わる人員（手続き業務の精通者、物流の再開に関わる船舶の操縦者、荷役機械の操縦者、完成自動車の荷役を行う熟練運転チーム等）を早期に参集させる。

②物流の再開に関わる船舶・機材の確保 [14] ★

港運業者、水先人会、曳船業者、海貨業者およびCIQは、物流の再開に必要な船舶や機材（荷役機械は別項目で後述）を確保し、物流の再開に備える。

7) 共通事項 - 事務所建屋の損傷・倒壊・浸水の応急復旧措置

①業務再開に向けた応急措置 [15] ★

重要な各事業所建屋が被災した場合、行政関係者、港湾利用者およびCIQは、メーカーや建設業関係団体等に相談し、建屋の応急措置を行う。また、被害が大きく復旧に長期間を要する場合は、代替事務所を確保する。

8) 係留施設、荷捌き施設及び保管施設等 - 岸壁の応急措置

①使用制限に関する情報の周知 [16]

岸壁の部分供用や暫定水深による供用を行う場合、港湾管理者および中部地方整備局は、岸壁の使用上の制約条件を明確にし、港湾利用者に周知させる。

2. 高潮発生時の時間別行動
(4) 3 日以内の行動（方針決定）

9) 道路 - 道路の応急措置

道路とは臨港道路及び一般道路とする。なお、一般道路とは、岸壁からくしの歯ルートに接続する一般道路及び衣浦トンネルのことを指す。

①交通規制等と耐震強化岸壁に通ずる道路の啓開及びその情報の周知 [17]

道路管理者は、交通規制の実施、迂回路設定や耐震強化岸壁に通ずる道路の啓開を行い、道路復旧見通しの整理を行う。各管理者は、問合せ時に情報提供する。なお、愛知県が管理する一般道路に関する主要情報は、道路情報センターに提供する。

また、衣浦港務所は、把握した各情報を整理し、衣浦港災害時対策会議において港湾利用者へ情報提供する。

②長期浸水対策用排水ポンプの調達 [18]

臨港道路管理者は、主要道路の浸水状況に応じて、港湾管理者、中部地方整備局および建設業関係団体等に協力を仰ぎ、長期浸水対策用排水ポンプを調達する。

10) 対象道路上の橋梁 - 橋梁の応急措置

①交通規制と迂回路の設定及び、その情報の周知 [19]

道路管理者は、交通規制や迂回路および復旧見通しに関わる情報を随時広く一般に広報し、臨港道路管理者はそれを港湾利用者に周知させる。

11) 沈埋トンネル - 沈埋トンネルの損傷、浸水の対応

①交通規制および、その情報の周知 [20]

衣浦トンネル管理者は、交通規制の実施、迂回路設定および復旧見通しの整理を行い、問合せ時に情報提供する。なお、主要情報は、道路情報センターに提供する。

また、衣浦港務所は、把握した各情報を整理し、衣浦港災害時対策会議において港湾利用者へ情報提供する。

表-1 衣浦トンネルの通行止基準

項目	基準
時間雨量	60mm
潮位	3.9m
震度	5 弱
津波	大津波警報

※2013 年 10 月 16 日現在の基準

- 2. 高潮発生時の時間別行動
- (4) 3日以内の行動（方針決定）
- (5) 1週間以内の行動（応急措置）

1 2) 臨海鉄道 - 立体交差部の落橋による道路の遮断の対応

①交通規制と迂回路の設定及び、その情報の周知 [21]

臨海鉄道事業者は、交通規制や迂回路および復旧見通しに関わる情報を整理し、道路管理者はそれを随時港湾利用者に周知させる。

(5) 1週間以内の行動（応急措置）

1) 共通事項 - 散乱物の除去（係留施設）

①散乱物(貨物、瓦礫)仮置ヤードの確保 [22] ★

港湾管理者は、被災状況を鑑みて、散乱物の仮置ヤードを指定（※貿易貨物の仮置ヤードについては、財務省の確認・許可を得る）し、建設業関係団体等に連絡する。また、港湾管理者または港運業者が必要に応じて荷主への連絡を行う。

⇒「発災時散乱物・漂流物仮置きヤードの候補地」（6 資料編 資料 9～11）

②散乱物除去用機材の確保(建設業関係団体等) [23] ★

港運業者および建設業関係団体等は、散乱物を除去するための機材や、岸壁の応急復旧に使用する資機材の確保に努める。

③散乱物の除去 [24] ★

港湾管理者、港運業者は、施設の応急復旧優先順位を踏まえて散乱物の除去作業に早期着手する。

2) 共通事項 - 散乱物の除去（道路）

①散乱物(貨物、瓦礫)仮置ヤードの確保 [25] ★

臨港道路管理者は、被災状況を鑑みて、散乱物の仮置ヤードを指定し、一般道路管理者および建設業関係団体等に連絡する。

⇒「発災時散乱物・漂流物仮置きヤードの候補地」（6 資料編 資料 9～11）

②散乱物除去用機材の確保(建設業関係団体等) [26] ★

臨港道路管理者および建設業関係団体等は、散乱物を除去するための機材や、道路の応急復旧に使用する資機材の確保に努める。

③散乱物の除去 [27] ★

臨港道路管理者は、道路の優先復旧順位を踏まえて啓開作業（散乱物の除去作業）に早期着手する。また、一般道路管理者にも、重要ルートの散乱物除去作業の早期着手の協力を依頼する。

2. 高潮発生時の時間別行動

(5) 1 週間以内の行動（応急措置）

3) 共通事項 - 物流システムの応急復旧（データ損失等を含む）

①システム復旧作業の早期着手 [28] ★

物流管理システムが被災した場合、港湾管理者、港湾利用者（水先人会除く）およびCIQ は、システム管理者に災害時対応を確認し、目標期間内の業務再開に向けたシステムの応急復旧に着手する。なお、サーバーの復旧に時間を要する場合は、当面の間アナログ対応に切り替える。

4) 共通事項 - 応急措置に関する情報提供

①港湾施設及び道路施設の使用制限に関する情報の周知 [29] ★

港湾管理者、中部地方整備局および道路管理者は、港湾施設および道路施設の応急措置の状況を踏まえ、使用制限や復旧見通し等に関する情報を随時港湾利用者に周知させる。

5) 水域施設（航路、泊地） - 航路啓開

①漂流物(貨物、瓦礫)仮置ヤードの確保 [30]

港湾管理者は、漂流物の仮置ヤードを指定（※貿易貨物の仮置ヤードについては、CIQ の確認・許可を得る）し、衣浦海上保安署および埋浚協会等に連絡する。

⇒「発災時散乱物・漂流物仮置きヤードの候補地」（6 資料編 資料 9～11）

②航路啓開用船舶、機材の確保(埋浚協会等) [31]

港湾管理者、中部地方整備局、衣浦海上保安署および埋浚協会等は、漂流物を除去するための船舶・機材の確保に努める。

③啓開作業の早期着手 [32]

港湾管理者は、航路啓開の優先順位を踏まえ、埋浚協会等に災害時対応を確認の上、衣浦海上保安署の協力を得ながら目標期間内の暫定供用に向けた啓開作業に着手する。

④潜水士の確保、他県への要請 [33]

埋浚協会等は、潜水協会に相談し、他県への要請も視野に入れて潜水士の確保に努める。

2. 高潮発生時の時間別行動
(5) 1 週間以内の行動（応急措置）

表-2 航路啓開の作業手順（案）

	作業項目	作業内容
STEP1	漂流物調査・除去等	・陸上及び船舶から漂流物の調査を実施するとともに、その場で除去できる木片等の軽量なものは直ちに除去する。 ・直ちに除去できない障害物については、その種別、数量、状況（拡散しているか、まとまっているか、漂流中か、半没状態か 等）を記録し、関係者間で情報を共有する。
	漂流物の一時的な移動	・直ちに除去できない漂流物については、さらに、関係者が連携して一旦船舶航行の障害とならない水域まで曳航し、漂流防止用のネットの設置、舳をとる等の漂流防止策をとって留置する。
	沈没物調査	・岸壁前面と当該岸壁に至る比較的水深の浅い水域等について、音響測深器による簡易な検測を行い、沈没物の有無を確認する。 ・沈没物を発見した場合には、その位置を関係者に周知し、注意喚起する。岸壁前面に沈没しているものについては、速やかに除去する。
STEP2	障害物の引き揚げ	・一旦船舶航行の障害とならない水域まで曳航した漂流物、直ちに除去できなかった沈没物を、クレーン付き台船、グラブ浚渫船等により引き揚げて除去する。
	浮標識による沈没物の標示	・発災後 1、2 週間での引き揚げが困難な沈没物については、その位置を関係者に周知するとともに、浮標式の設置等により標示し、注意喚起する。

6) 沈埋トンネル - 沈埋トンネルの浸水の対応

①他機関からの排水ポンプの確保 [34]

沈埋トンネル管理者は、排水ポンプの確保に努める。困難な場合は、中部地方整備局や建設業関係団体等に排水ポンプ確保の協力を要請する。

2. 高潮発生時の時間別行動
(6) 2 週間以内の行動（応急復旧着手）

（6）2 週間以内の行動（応急復旧着手）

1）共通事項 - 応急復旧状況に関する情報提供

①港湾施設及び道路施設の使用制限及び、復旧見通しに関する情報の周知 [35] ★

港湾管理者、中部地方整備局および道路管理者は、港湾施設および道路施設（一般道路管理者からの情報も含む）の応急復旧工事の進捗状況を踏まえ、使用制限や復旧見通し等に関する情報を随時港湾利用者に周知させる。

2）係留施設、荷捌き施設及び保管施設等

- 荷役機械の応急復旧（グラブバケット、ホッパー等）

①発災時応急復旧作業の早期着手 [36]

荷役機械が被災した場合、港運業者は、メーカー等に災害時対応を確認し、目標期間内の業務再開に向けた荷役機械の応急復旧に着手する。なお、復旧に時間を要する場合は、他港も含めた同業他社や建設業関係団体等に代替機械の借用について依頼する。

3）係留施設、荷捌き施設及び保管施設等

- 倉庫・上屋の応急復旧

①発災時応急復旧作業の早期着手 [37]

倉庫等が被災した場合、港湾管理者、港運業者および陸運会社は、目標期間内の暫定供用に向けた応急復旧に着手する。必要に応じて代替となる倉庫を確保する。

4）係留施設、荷捌き施設及び保管施設等

- SOLAS 施設の応急復旧

①発災時応急復旧作業の早期着手 [38]

SOLAS 施設（フェンス、照明灯等）が被災した場合、港湾管理者は、目標期間内の暫定供用に向けた応急復旧に着手する。

5）外郭施設（防波堤） - 防波堤の応急復旧

①発災時応急復旧作業の早期着手 [39]

防波堤が被災した場合、港湾管理者および中部地方整備局は、埋浚協会等に災害時対応を確認し、応急復旧に着手する。

6) 対象道路上の橋梁 - 橋梁の応急復旧

①発災時応急復旧作業の早期着手 [40]

主要道路の橋梁に被害が生じた場合、臨港道路管理者は、物流再開に向けた災害時対応について、橋梁メーカーに確認し、応急復旧に着手する。また、一般道路管理者に、重要ルート of 橋梁について応急復旧作業の早期着手を依頼する。

7) 沈埋トンネル - 沈埋トンネルの浸水の対応

①発災時応急復旧作業の早期着手 [41]

沈埋トンネルに被害が生じた場合、沈埋トンネル管理者は、事前に検討した復旧優先順位等を参考に、目標期間内の物流再開に向けた応急復旧に着手する。

2. 高潮発生時の時間別行動
(7) 暫定物流の再開まで順次

(7) 暫定物流の再開まで順次

- 1) 係留施設、荷捌き施設及び保管施設等
- 港内静穏度の不足対応

①係留を補助するタグボートの手配 [42]

防波堤が被災した場合、船舶代理店および曳船業者は、必要に応じてタグボートを手配する（広域連携含む）。

- 2) 係留施設、荷捌き施設及び保管施設等
- SOLAS 施設の応急復旧

①SOLAS 要員の確保 [43]

港湾管理者は、SOLAS 要員の確保に努める。

- 3) 係留施設、荷捌き施設及び保管施設等
- 応急復旧状況に関する情報提供

①使用制限及び、復旧見通しに関する情報の周知 [44]

港湾管理者および中部地方整備局は、係留施設の使用制限や復旧見通しに関する情報を随時港湾利用者に周知させる。

- 4) 水域施設（航路、泊地） - 航路啓開後の水深の確認

①安全確認水深の確認と情報の周知 [45]

航路啓開後、港湾管理者および中部地方整備局は、衣浦海上保安署の確認のもと、安全確認水深を港湾利用者に周知させる。

- 5) 道路 - 貨物輸送ルートの確認

①通行可能ルートの情報の周知 [46]

道路管理者は、通行可能ルートの情報を随時広く一般に広報し、臨港道路管理者はそれを港湾利用者に周知させる。

- 6) 対象道路上の橋梁 - 貨物輸送ルートの確認

①通行可能ルートの情報の周知 [47]

道路管理者は、通行可能ルートの情報を随時広く一般に広報し、臨港道路管理者はそれを港湾利用者に周知させる。

7) 沈埋トンネル - 貨物輸送ルートの確認

①通行可能ルートの情報の周知 [48]

沈埋トンネル管理者は、通行可能ルートの情報を随時広く一般に広報し、臨港道路管理者はそれを港湾利用者に周知させる。

(8) 衣浦港フェーズ別高潮・暴風対応計画

（８）衣浦港フェーズ別高潮・暴風対応計画

1) 港灣管理者

愛知県 衣浦港フェーズ別高潮・暴風対応計画【港湾管理者】												
フェーズ			人命の安全確保、情報伝達等			物流機能の維持						
港長の勧告等			A:情報共有・提供			B:施設管理の指示		C:その他	D:移動・退避	E:固定作業	F:動かない資産	
①準備・実施段階 (目安) 台風最接近の 2～5日 前	起り得る自然現象		台風の発生	高波	強風	A1 緊急連絡網の確認、荷役機器の安全運用状況の確認 A2 緊急情報取組、港湾利用者への注意喚起 A3 港長勧告に関する検討の情報収集・共有 A4 職員の状態把握(所定、行動予定の再確認) A5 非常配備準備情報の提供 A6 港湾関係者への注意喚起文書の送付(港湾管理者) A7 気象官署、県・市等公共施設管理者、保安部、国・県・市道等公共機関との情報交換 A8 指定管理者への情報提供及び注意喚起(港湾管理者) A9 要注意施設の有無の確認	B1 公共施設周辺物資機材の固縛等整理及び利用者への整理指示 B2 港湾利用者への対策状況確認 B3 協力要請情報の確認 B4 防犯・防衛等の点検指示 B5 通信設備の点検・通信状態確認 B6 港務船の状況確認	C1 非常用電源設備の燃料等の動作確認	DE1 船舶、機械の状況の確認 DE2 橋内退避船舶の安全性確認(係留状況) DE3 港湾区域内の港湾工事を実施する作業船の避難開始指示	E:固定作業	F:動かない資産	
	②完了段階 (目安) 台風最接近の 1～2日 前	台風最接近の1～2日前	大雨	土砂災害	暴風	A10 台風対策委員会の出席 A11 災害協力団体への事前要請 A12 避難への避難・帰省指示 A13 港湾施設利用者の台風要請完了の報告及び確認(係留船舶等) A20. 作業員等への退避指示	B7 管理施設と要注工事現場の点検 B8 職員国外作業及び工事事業者の作業中(風の影響が始めた時点) B9 水門・陸門等の操作体制確認	C2 公用車の高所移動、損傷対策、燃料補充、車高の高い車両の手配	DE4 入港中の船舶の退泊、退避の指示・連絡の情報確認		F1 庁舎、上層への浸水対策・補強(土置設置、補強作業等) F2 荷役機器電源設備の防水補強	
		台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	A14 非常配備体制の確認、行動要請の開始 A15 交通機関・道路の状況把握	B10 事務所内電機、通信機器の動作確認と高所移動、燃料確保、充電	C3 対策機材の準備(小型は電気、照明、工事用品)	DE5 船舶の固縛等対策の指示・連絡の情報確認		
	③確認段階 (目安) 台風最接近の 半日～1日前	台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	A16 職員の安全確認 A17 港務所へのリエンジニア派遣(1日前 伊勢湾台風クラスが想定される場合) (中堅一港務所)						
		台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	A18 防潮堤、水門、陸門等の閉鎖情報共有 A19 関係港湾施設の台風対策完了の情報共有(避難、固縛、防水、臨港道路規制など)	B11 水門・陸門等の閉鎖施設確認					
台風最接近の6時間前			台風最接近の6時間前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の2～5日前			台風最接近の2～5日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の1～2日前			台風最接近の1～2日前	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	暴風	高潮	
台風最接近の半日～1日前			台風最接近の半日～1日前									

2) 一般貨物

愛知県 衣浦港フェーズ別高潮・暴風対応計画【一般貨物】

フェーズ		港長の 勧告等	人命の安全確保、情報伝達等			物流機能の維持		
			A: 情報共有・提供	B: 施設管理の指示	C: その他	D: 移動・退避	E: 固定作業	F: 動かない資産
① 準備・実施段階 (目安) 台風最 接近の 2～5日 前			A1.社員への気象情報提供(台風情報) A2.社員の状況把握(行動予定、シフト予定)	B1.社屋、倉庫、岸壁の状況確認(飛散・転倒等被害の防止) B2.非常用無線電話等の事前通信試験 B3.自家発電機の動作確認および燃料の確認	C1.船舶の予定・位置確認 C2.荷主への天候・貨物状況報告及び調整 C3.港湾管理者との調整	D1.運送業者への配車依頼早期出荷、対応指示(納入先と協議の上、早期出荷が可能な場合) D2.荷主との調整(納入時期の後送り可否に関する納入先との協議(運送業者・現場に納入日後送りの連絡)) D3.トラック輸送業者へ輸送上の状況報告(随時)の協力依頼	E1.飛散防止用シートの展開・流失防止設備の補強 E2.施設点検、残骸のネットなどの強度確認点検(暴風への備え点検)	F1.台風対策用備品・タオル・給水シート(土のうの数量、ビニールシート他)の確認および補充
			A3.台風対策委員会への出席	B4.社屋の浸水対策実施(土のう設置等) B5.対策備品の準備(小型発電機、照明、工具用品)		D4.移動式荷役機械・作業車面の退避	E3.ハレット等屋外資材の固定	F2.社屋(電気室、事務所等)・倉庫・設備の浸水対策実施(開閉、施設状況の確認及び土壌設置) F3.倉庫・設備の電源設備の防水補強、標識の補強 F4.社有の防潮庫の閉鎖(施設がある場合)
② 完了段階			A4.社員への避難準備指示 A5.交通機関・道路の状況把握	B6.電子機器の安全確保(PCの浸水対策)		D5.高所や倉庫内への貨物移動	E4.建物の扉の固定	
② 完了段階			A6.社員への避難指示、帰宅困難者対応 A7.社員の安全確認 A8.出勤、自宅待機の指示(出勤前の場合)		C4.社用車の高所移動	D6.本船荷役作業の中止		
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								
③ 確認段階								

【※陸上作業の停止基準案】
・ヤードクローズ
・暴風・高潮警報もしくは暴風・高潮特別警報
・自治体の避難勧告等
・交通インフラの停止状況
・荷主の了解

